



ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MART 2018

I. YÖNETİCİ ÖZETİ

1970 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Bursa Tıp Fakültesi ile temeli atılan Üniversitemiz bugün 4 Enstitü, 14'ü faal 15 Fakülte, 1'i faal 2 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 24 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 2 Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe Bağlı olarak kurulan 5 Bölümde, 2348'i akademik olmak üzere toplam 4695 personeli ve 74.822 öğrencisi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

2547 sayılı Kanunun 12. Maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın üniversiteler arasında yer almayı hedefleyen Üniversitemizde öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkanı sunulması, gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarla mümkün olacaktır.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılması esası getirilmiş olup, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ise yatırım projelerinin belirlenmiş amaçlar ve yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak hazırlanması, yıllık plan ve programlar ile uyumlu ve eş zamanlı olarak önerilmesi ve yılı yatırım programlarına uygun olarak tamamlanması ile mümkündür.

Bu kapsamda 2017 yılı yatırım programında Üniversitemiz eğitim, sağlık ve araştırma geliştirme yatırımları için 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 75.342.000.- TL. ödenek tefrik edilmiş olup yıl içinde yapılan mali revizyonlar neticesinde yıl sonu toplam yatırım ödenekleri %21,39 artışla 91.455.965.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen 2.000.000.- TL. ödenek yatırım programında yer almıştır.

Üniversitemizde sağlanan kaynaklar ile Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mevcut Cam Sera Proje hizmeti Alımı, Mevcut Merkez Kütüphane Mimari Tadilat Projesi ve Statik (Güçlendirme) Proje Alımı, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Kompleksi (Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Salon ve Eğitim Merkezi), Mimari ve Statik Proje Alımı Bilgi İşlem Binası Projelerinin Alımı, Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu (2.750m²) Statik Performans Analiz Raporu Hazırlanması, Uludağ Üniversitesi SUAM Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Avan Proje Alım, SUAM A1 Blok revizyon ve İlave Kat A2 Blok Sedyeye Asansör Taşıyıcı Projelerinin alım, SUAM A4 Blok Mimari Revizyon, Güçlendirme Proje Revizyonu Uygulama Projelerinin Hazırlanması (11.088m²), SUAM A Blokları Isı Merkezi ve A4 Blok Deprem Güçlendirme Mekanik ve Elektrik Tesisat İşleri uygulama projeleri hazırlanmıştır.

2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2


Göz Hastalıkları Önü Korkuluk İle Engelli Yolu ve Otopark Yapılması, ayrıca bağlı birim ve merkezlerde çeşitli alt yapı işleri yapılmıştır.

• Atletizm Pisti Tribünü yapımı işi devam etmektedir. Atletizm Pisti Tribün inşaatı Proje revizyonu gerektiğinden 2018 yılında tamamlanacaktır.

Sağlık Uygulama Merkezi SUAM A-B Blok muhtelif birimlerin kapı pencere doğramaları ve banyo tadilatları tamamlanmıştır.

Ayrıca mevcut binaların güçlendirme, yangın güvenliğini sağlama, engellilere uygun hale getirme tadilat ve onarımları, yapılmaya devam edilmektedir.

Üniversitemiz 2017 yılı yatırımlarına ilişkin detay bilgiler raporda sunulmuş olup kurumlar arasında etkin bir koordinasyon sistemi oluşturularak yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi yatırım planlamaları ve sonuçları açısından önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesine göre ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlanan üniversitemiz 2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun kamu yatırım planlamalarına katkı sağlamasını içtenlikle dilerim.


Prof. Dr. Yusuf ULCAY
Rektör

II. GENEL DEĞERLENDİRME

1. Uludağ Üniversitesi Misyonu

Bilimsel ve mesleki bilgi birikimi ile tercih edilen bireyler yetiştirmek, nitelikli ve özgün bilgi üretmek, ürettiği bilgi sayesinde tüm sektörlerle işbirliği yaparak kalkınmaya katkı sağlamaktır.

2. Uludağ Üniversitesi Vizyonu

Kaliteli eğitimi ile tercih edilen, nitelikli bilimsel araştırmalar yapan, yenilikçiliği ve girişimciliği ile refah artışına katkı sağlayan üçüncü nesil üniversite olmaktır.

3. Temel Değerler

- Ortak Akıl ve Katılımcılık
- Etik Değerlere Bağlılık
- Kurumsal Aidiyet
- Yenilikçilik ve Girişimcilik
- Çevreye Saygı ve Duyarlılık
- Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı
- Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek

4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri :

Stratejik Amaç ve Hedefler: 2017-2021 dönemine ait Üniversitemiz stratejik planında 6 adet amaç ve 19 adet stratejik hedef öngörülmüş olup amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir.

SA1 3. NESİL ÜNİVERSİTENİN RUHUNA UYGUN, KÜRESEL ÖLÇEKTE YARIŞAN, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİREYLER YETİŞTİRMEK		
SH1.1	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Arttırmak ve Girişimci Programlarla Desteklemek	
SH1.2	Eğitim ve Öğretimi Uluslararası Normlar Çerçevesinde Desteklemek	
SH1.3	Öğretme ve Öğrenme Ortamlarının Master Plan Çerçevesinde Fiziksel ve Teknolojik Altyapısını Dönem Sonunda %30 Arttırmak	

SA2 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTIRARAK SONUÇLARI İLGİLİ SEKTÖRLERDE UYGULAMAYA AKTARMAK		
SH2.1	Bilimsel ve Teknolojik Gelişime Katkı Sağlayan İleri Düzeyde Araştırmalar Yapmak ve AR- GE Bilincini Arttırmak	
SH2.2	Uluslararası Alanlarda Yapılan Yayınların Nitelik ve Niceliğini Arttırmak	
SH2.3	Araştırmalardan Elde Edilen Sonuçlardan Patent, Faydalı Model ve Tescil Almak ve Bunları Uygulamaya Aktarmak	
SH2.4	Lisansüstü Araştırmaları Nitelik ve Nicelik Olarak İyileştirmek	
SH2.5	Araştırma Altyapısını Dönem Sonunda %30 Arttırmak	

SA3 3.NESİL ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINDA GİRİŞİMCİLİĞİ VE İNOVASYONU GELİŞTİRMEK		
SH3.1	Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kapasitesini Arttırmak	
SH3.2	Paydaşları Girişimciliğe ve İnovasyona Özendirmek ve Desteklemek	

SA4 SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN HİZMET KALİTESİNİ VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTTIRMAK		
	SH4.1	Sağlık Hizmetlerinin Fiziki Alanlarını ve Sağlık Teknoloji Altyapısını İyileştirmek
	SH4.2	Sağlık Hizmetlerinin Kalite Düzeyini Arttırmak
	SH4.3	Hayvan Hastanesi Hizmetlerini Arttırmak

SA5 YÜKSEKÖĞRETİMİ DAHA YAYGIN VE ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRMEK		
	SH5.1	Uzaktan Eğitim ile Açık Öğretimin Altyapısını Oluşturmak
	SH5.2	Uzaktan Eğitim Programlarını Oluşturmak ve Dönem Sonunda Program Sayısını %75 Arttırmak

SA6 KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK		
	SH6.1	Personelin Kuruma Bağlılığını Arttırmak
	SH6.2	Öğrenci ve Çalışanlara Yönelik Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanları ve Hizmet Kalitesini Arttırmak
	SH6.3	Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek
	SH6.4	Dönem Sonunda İş Güvenliği Bilincini ve Altyapısını Geliştirmek

4. Yatırım Kaynakları

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz sermaye giderleri için 75.342.000.- TL. ödenek tefrik edilmiştir. Ayrıca taşıt alımı için hibe olarak karşılanmak üzere 101.000.-TL ile Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere 2.000.000.- TL ödenek yatırım programında yer almış olup program yılı ödenekleri proje bazında tabloda gösterilmiştir.

2017 PROGRAM YILI ÖDENEKLERİ

SEKTÖR	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAKLAR		
			ÖZEL BÜTÇE	DÖNER SERMAYE	TOPLAM
EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ	2013H031800	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000		100.000
	1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	16.000.000		16.000.000
	1978H030070	Kampüs Altyapı	3.000.000		3.000.000
	2010H031840	Muhtelif İşler Projesi Taşıt Alımı (1)	6.900.000 (101.000)		6.900.000 (101.000)
	2017H037040	Yayın Alımı	2.000.000		2.000.000
SAĞLIK SEKTÖRÜ	2017I000620	Muhtelif İşler Projesi (2)	18.000.000	(2.000.000)	20.000.000
	2017I000590	Kadın Doğum ve Çocuk Hast. Proj.	19.500.000		19.500.000
BEDEN EĞT.SP. SEK	1992H050270	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.500.000		1.500.000
TEK. ARAŞ. SEK.	2017K120570	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	8.332.000		8.332.000
	2011K120400	Merkezi Araştırma Lab.	10.000		10.000
TOPLAM			75.342.000	2.000.000	77.342.000

- (1) Parantez içindeki tutar hibe olarak karşılanacaktır.
(2) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenektir.

5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi ve 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Açıklama: 2016 yılı sonu itibariyle toplam fiziki alan 689.272 m² olup 2017 yılında hedeflenen üretim kapasitesi 79.509 m²'dir. 2017 yılında fiziki gerçekleşme 9.066 m² olup gerçekleştirmeler birimler itibariyle tabloda gösterilmiştir.

Birim / Tesis Adı	FİZİKİ ALANLAR							
	Eğitim Alanları			Sosyal Alanlar		HİZMETE AÇILAN ALAN		
	İdari Binalar	Derslik	Lab.	Kantin Cafe vb.	Diğer Alanlar	2016 Mevcut Alan (Yılı Sonu)	2017 Hedeflenen Kapasite Artışı	2017 Gerç. Kapasite Artışı
FAKÜLTELER								
İkt. İd.Bi.Fakültesi (Görükle)	13.513	8.082	900	800	4.571	27.866		
Mühendislik Fakültesi	8.100	14.000	13.500	281	6.728	42.609		
Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl	1.500	3.000	351		1.000	5.851		
Mimarlık Fakültesi	1.757	576	99	84	1.045	3.561		
Eğitim Fakültesi	4.092	12.078	2.932	2.812	9.032	30.946		
Ziraat Fakültesi	3.682	5.623	3.796	512	3.797	17.410		
Ziraat Fak. Çiftliği	1.500	900	5.215		4.312	11.927		
Veteriner Fakültesi	4.000	4.500	3.250	265	6.685	18.700		
Veteriner Fak. Çiftliği	1.250	1.700	6.870	100	4.246	14.166	2.300	
Fen Edebiyat Fakültesi	1.281	2.340	2.920		3.330	9.871		
Fen Bilimleri	7.450	1.341	1.916	92	7.683	18.482		
Spor Bilimleri Fakültesi	408	422	68		602	1.500		
Sağlık Bilimleri Fakültesi							4.443	4.443
İlahiyat Fakültesi	13.134	3.000		862	5.215	22.211		
Güzel Sanatlar Fakültesi (Mudanya)	750	1.000	150		913	2.813		
Hukuk Fakültesi (Gemlik)	300	3.371	120		980	4.771		
İşletme Fakültesi (İnegöl)	703	945		202	1.450	3.300		
TOPLAM	63.420	62.878	42.087	6.010	61.589	235.984	6.743	4.443
MESLEK YÜSEKOKULLARI								
Sağlık Hizmetleri MYO (Görükle Kamp.)	307	270		50	140	767		
Sağlık Yüksek Okulu (Görükle Kamp.)	376	330		150	602	1.458		
Teknik Bilimler MYO	760	3.009	3.000	150	1.650	8.569		
Yenişehir İ.O. MYO	800	1.500	300	130	441	3.171		
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Yerleşkesi	833	1.296	587		5.976	8.692	200	200
Gemlik MYO	1.324	1.115	200	1.250	1.841	5.730		
Gemlik MYO Sosyal Tesis				1.750		1.750		
Orhaneli MYO	100	773	100	40	187	1.200	3.873	3.873
Keles MYO	100	750	125	70	317	1.362		
Karacabey MYO	800	3.900	500	180	692	6.072		
Mustafa Kemalpaşa MYO	900	3.250	1.000	174	676	6.000		
İznik MYO	500	700	1.027	300	1.914	4.441		
İnegöl MYO	1.000	4.000	2.494	700	7.718	15.912		
Sosyal Bilimler MYO (A.O.S.Kamp.)	700	2.600		140	560	4.000		
Yabancı Diller (A.O.S. Kampüsü)	800	3.200	1.300		700	6.000		
Devlet Konservatuvarı	657	2.476		254	4.484	7.871		
Denizcilik Yüksekokulu Gemlik	800	1.500			654	2.954		
Harmancık MYO	800	1.200			476	2.476		
Büyük Orhan MYO	650	1.500			108	2.258		
Mennan Pasinli MYO							1.115	
TOPLAM	12.207	33.369	10.633	5.338	29.136	90.683	5.188	4.073

2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 8

Birim / Tesis Adı	FİZİKİ ALANLAR							
	Eğitim Alanları			Sosyal Alanlar		HİZMETE AÇILAN ALAN		
	İdari Binalar	Derslik	Lab.	Kantin Cafe vb.	Diğer Alanlar	2016 Mevcut Alan (Yılı Sonu)	2017 Hedeflenen Kapasite Artışı	2017 Gerç. Kapasite Artışı
SAĞLIK MERKEZLERİ								
Tıp Fakültesi Hastanesi (S.U.A..M.)	82.471	8.000	10.319	1.248	60.475	162.513		
T.T.B. Gaz Merkezi					600	600		
İyi Hekimlik	17	150	526	150	887	1.730		
Sahra Sağlık Merkezi	200				10.591	10.791		
Mediko Sosyal Sağlık Mrk.					767	767		
Atatürk Hidro Terapi Merk.(Kükürtlü)	300	675	3.075	250	618	4.918		
Radyasyon Onkoloji			140			140		
Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji Hastanesi	522		340	15	7315	8192		
Hastane Arşiv Asma Kat (Isı Merkezi)					200	200		
TOPLAM	83.510	8.825	14.400	1.663	81.453	189.851	0	0
SPOR SAHALARI								
Çok Amaçlı Spor Salonu	1631			477	6.261	8.369		
Açık Tenis Kortları 6 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı)					3.971	3.971		
Arletizm Pisti (Tarton Pist)					19.000	19.000		
Arletizm Pisti (Tarton Pist Tribün)							3.634	
Basket-Voleybol Sahaları (1-2) 2 adet (Eğt.Fak.Bed.Eğt.Yanı)					1.600	1.600		
Basket-Voleybol Sahası (1-2) 2 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı)					1.000	1.000		
Basket-Voleybol Sahası N.Hatun - Gül.Osm.Köse Yurdu Arası					500	500		
Spor Bil. Fak. Spor Salonu					2.750	2.750		
Spor Bil. Fak., Jimn. Salonu					966	966		
Futbol Sahası ve Kapalı Tribün					11.036	11.036		
Kapalı Tenis Kortları (1-2) 2 adet (Rek.Kap.Sp.Sal.Yanı)					1.776	1.776		
Rek. Kapalı Spor Salonu	50			75	1.375	1.500		
Sosyal Tesis. Kafeterya (Rek.Kap. Spor Sal.Yanı)							960	
Futbol sahası yanı halı saha					3.320	3.320		
Basket Sahası (İnegöl)					800	800		
Halı Saha (Gemlik)					3320	3320		
Basket Sahası (M.Kemalpaşa)					500	500		
Nilüfer Belediyesi Halı Saha					1.250	1.250		
Nilüfer Belediyesi Basket Sahası (2 Adet)					728	728		
İznik MYO Spor Tesisleri							2.650	
TOPLAM	1.681			552	60.153	62.386	7.794	550

2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 9

Birim / Tesis Adı	FİZİKİ ALANLAR							
	Eğitim Alanları			Sosyal Alanlar		HİZMETE AÇILAN ALAN		
	İdari Binalar	Derslik	Lab.	Kantin Cafe vb.	Diğer Alanlar	2016 Mevcut Alan (Yılı Sonu)	2017 Hedeflenen Kapasite Artışı	2017 Gerç. Kapasite Artışı
YURT VE LOJMANLAR								
Rabia Rıza Biçen Yurdu	100			300	5.475	5.875		
Nilüfer Hatun Yurdu	100			200	3.050	3.350		
Güler Osman Köseoğlu Yurdu	50			100	1.930	2.080		
Orhaneli MYO (Yurt)					174	174		
Rektörlük Misafir Lojmanları					206	206		
Personel Lojmanları (8 ad.)					12.202	12.202		
Veteriner Fak. Çifliği (Loj.)					1.200	1.200		
Ziraat Fak. Çifliği (Loj.)					200	200		
Yenişehir Öğr. Yurt Binası	200				2.752	2.952		
Karacabey Yurt Binası	150				3.530	3.680		
TOPLAM	600	0	0	600	30.719	31.919	0	0
DİĞER BİNALAR								
Mediko - Sosyal	1.550	140	1.000	7.500	2.374	12.564		
Kampüs Camii					2.753	2.753	20.000	
İlahiyat Camii			1.000		500	1.500		
İlahiyat Kültür Merkezi					2.634	2.634		
Akademik Merkez Kütüphane	1.300		6.500		2.350	10.150	4.284	
Oditoryum					6.125	6.125		
Enstitüler	400	432	240		1.368	2.440		
Kreş ve Ana Okulu	200	900			1.017	2.117		
Isı Merkezi	50				2.050	2.100		
İtfaiye - Sivil Savn.- Güvenlik	200				1.454	1.654		
Kampüs (Skada Merkezi)					325	325		
Kampüs Alt Yapısı (Trafo+Jen.21Ad.)					1.500	1.500		
Kampüs Emniyet Binası					123	123		
Gölet Bölgesi Wc Binası					25	25		
Fen-Ed. Fak. Sosyal Bil. Öğr. Sos.Tesisi					297	297		
Eğt.Fak.Öğr.Sosyal Tesisi				2.000	300	2.300		
Besaş-Üniversite Ekmek Üretim Binası			1.000			1.000		
Matbaa ve Çok Amaçlı Atölye Binası	39			16	1.559	1.614		
Telefon Sanral Binası	200					200		
Çamlık Personel Yemekhanesi	185			1.573	642	2.400		
Kariyer Merkezi	115				29	144		
Sürekli Eğitim Merkezi	117				76	193		
Türk Dünyası Akraba Toplulukları (TÜDAM)	478			35	357	870		
A.O. Sönmez Kam. Pers. Ve Öğr. Yemekhanesi				484		484		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	780				1.063	1.843		
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	210		1.272		833	2.315		
Merkezi Derslik ve Labaratuvar							33.500	
Yeni Su Deposu (10.000 m²)							2.000	
TOPLAM	4.834	1.472	9.740	11.124	27.858	59.670	59.784	0
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ								
Teknoloji Araş.Geliş.Mrk. (ULUTEK)	200		1.200	200	17.179	18.779		
TOPLAM	200	0	1.200	200	17.179	18779	0	0
GENEL TOPLAM	166.452	106.544	78.060	25.487	308.087	689.272	79.509	9.066

6. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI:**6.1. Sektör Bazında Genel Yatırım Uygulama Durumu**

BİN TL

Sektör	Proje sayısı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Eklenen	Revize Ödenek	Harcama	2017 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (*)
Eğitim Yükseköğretim	5	399.500	28.000 (101)	12.365	40.365 (101)	19.063	47%
Sağlık	2	270.000	37.500 (2.000)	2.526	40.026 (2.000)	4.636	12%
Beden Eğitimi ve Spor	1	5.000	1.500	875	2.375	2.374	99%
Teknolojik Araştırma	2	20.886	8.342	348	8.690	8.680	99%
TOPLAM	10	695.386	75.342 (101) (2.000)	16.114	91.456 (101) (2.000)	34.753	38%

* Oranlar yıl sonu revize ödenek esas alınarak tespit edilmiştir.

(1) Parantez içindeki tutar hibe olarak karşılanacaktır.

(2) Parantez içindeki tutarlar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmıştır.

6.1.1. Eğitim Yüksek Öğretim Sektörü

Yıl içinde 5018 Sayılı Kanununun 35. maddesi gereğince devreden taahhüt artıklarından 223.000.- TL., 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından 12.142.000.- TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %44,16 artışla 40.365.000,78.- TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %47 olmuştur.

6.1.2. Beden Eğitimi ve Spor Sektörü

Yıl içinde 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından 875.000.-TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %58,3 artışla 2.375.000.-TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %99 olmuştur.

6.1.3. Sağlık Sektörü

Yıl içinde 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından 2.526.000.- TL. ödenek eklenmesi neticesinde ve 2.000.000.- TL. Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenek ile birlikte sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %6,73'lük artışla 40.026.000.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Yapılmış olan ihalelere bağlı işler devam ettiğinden nakdi gerçekleşme %12 düzeyinde gerçekleşmiştir.

6.1.4. Teknolojik Araştırma Sektörü

Yıl içinde 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından 347.965,21.-TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu revize ödenek %4,17 artışla 8.689.965,21.- TL. olarak gerçekleşmiş olup ödeneğin tamamı ilgili mevzuat gereğince tahakkuka bağlanmak suretiyle özel hesaba aktarılmıştır.


III. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

1.EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2017 Sonu Kümülatif Harcama
2013H031800	Etüd-Proje	2013-2018	4.973	100	2.946	717	55	2.744

Üniversitemiz mülkiyetinde ki 9.750.000 m² alan içerisinde, mastır plan çerçevesinde daha önce yapılan imar planı doğrultusunda İmar Kanunu 18. madde uygulanması işi tamamlanmıştır.

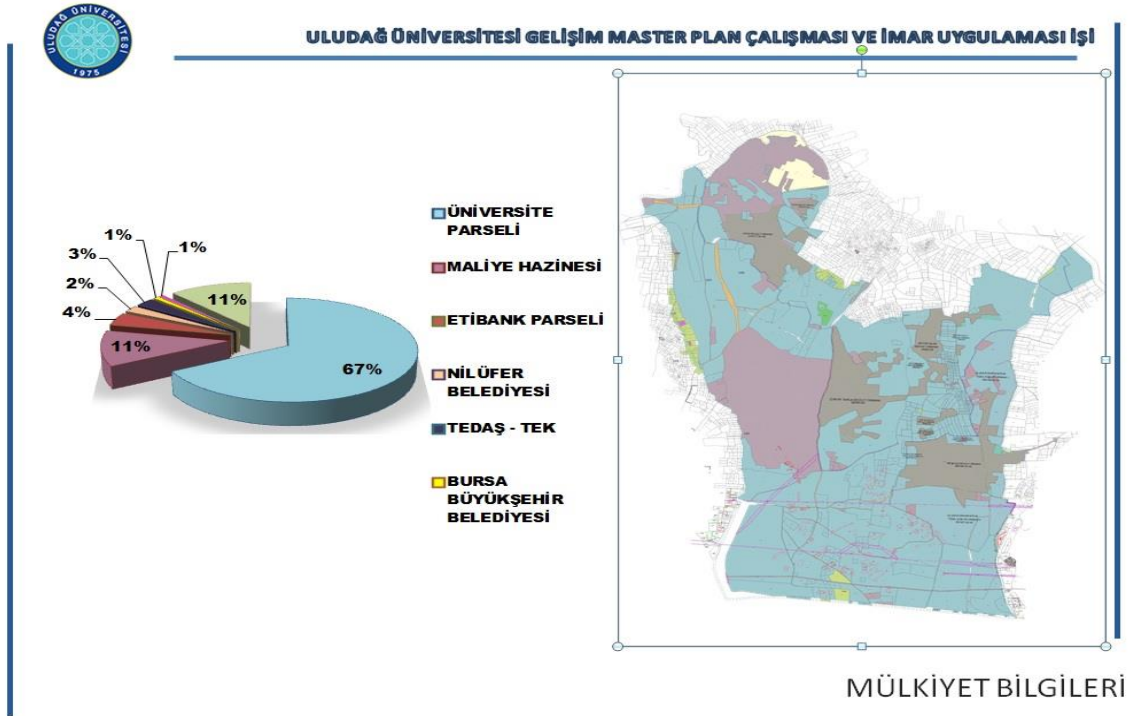

Açıklamalar :

1) Proje Revizyonları :

Yıl içinde 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 6/5 maddesine istinaden projeye 2.846.000.- TL. eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı 2.946.000.- TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %55 olarak gerçekleşmiştir.

2) 2) 2017 Yılında Tamamlanan Etüd -Projeler;

- 1400 hektar alanda revizyon nazım ve uygulama imar planı yapımı hizmet alımı.2017 Yılında İhale edildi (ilk Hakediş Ödendi İş Devam etmektedir)
- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri (6. Kısım) (Yoğun Bakım Tadilat Projesi)
- Çeşitli üniteler etüt projesi (5. Kısım) Geliştirme mastır plan çalışması ve imar uygulaması devam ediyor.(2016 yılında ihale edildi. 2017 Yılında 1. Hakediş ödemesi yapıldı. Devam ediyor.)
- Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mevcut Cam Sera Proje hizmeti Alım İşİ
- Uludağ Üniversitesi Mevcut Merkez Kütüphane Mimari Tadilat Projesi ve Statik (Güçlendirme) Proje Alım İşİ
- Spor Bilimleri Fakültesi Spor Kompleksi (Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Salon ve Eğitim Merkezi) Mimari ve Statik Proje Alım İşİ
- Bilgi İşlem Binası Projelerinin Alım işİ
- -Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu (2.750m²) Statik Performans Analiz Raporu Hazırlanması
- -Uludağ Üniversitesi SUAM Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Avan Proje Alım İşİ
- SUAM A1 Blok revizyon ve İlave Kat A2 Blok Sedye Asansör Taşıyıcı Projelerinin Alım İşİ
- -SUAM A4 Blok Mimari Revizyon, Güçlendirme Proje Revizyonu Uygulama Projelerinin Hazırlanma İşİ (11.088 m²)
- SUAM A Blokları Isı Merkezi ve A4 Blok Deprem Güçlendirme Mekanik ve Elektrik Tesisat İşleri Uygulama Projelerinin Hazırlanması

1.2. Kampüs Altyapısı

								Bin TL
Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2017 Sonu Kümülatif Harcama
1978H030070	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	1978-2019	150.000	3.000	3.000	2.125	94	141.251

GÖZ HASTALIKLARI ÖNÜ KORKULUK İLE ENGELLİ YOLU VE OTOPARKI



Açıklamalar :

1) Proje Revizyonları :

Proje kapsamında yapımı planlanan Kampüs Altyapısı projesine 2017 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 3.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl sonu ödenek toplamı 3.000.000.-TL. olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %94 olarak gerçekleşmiştir.

2) 2017 Yılında Kampus Altyapı İmalatları

- Göz Hastalıkları Önü Korkuluk İle Engelli Yolu ve Otopark Yapılması
- Bağlı birim ve merkezlerde 47 adet altyapı işi yapılmıştır.

1.3. Derslikler ve Merkezi Birimler

Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Bin TL	
							Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2017 Sonu Kümülatif Harcama
1991H031400	Kütüphane Ek Binası (4.500 m2) Merkezi Derslikler ve Laboratuvar Binası (20900 m2) Sağlık Yüksek Okulu (3.200 m2)	1991-2019	140.000	16.000	16.223	2.856	79	110.049

Kütüphane Ek Hizmet Binası



Merkezi Derslikler ve Laboratuvar Binası Yapımı





Açıklamalar:

1) Proje Revizyonları :

Proje kapsamında 2017 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 16.000.000.-TL. ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 223.000.-TL. eklenmesi neticesinde toplam ödenek 16.223.000.-TL. olarak gerçekleşmiştir. Nakdi gerçekleşme oranı %79'dur.

2) 2017 yılında tamamlanan Yapım İşleri;

İhalesi 2016 yılında yapılan Kütüphane Ek Hizmet Binası devam etmektedir. İş süresi Uzatımı verildiğinden İnşaatı devam etmektedir.

Merkezi Derslikler ve Laboratuvar Binası yapım ihalelerine 2016 yılı sonunda çıkmıştır. İptal edilen Merkezi Derslikler ve Labaratuvar Binası yapım ihalesi proje revizyonu yapılarak 2017 yılında ihalesi yapılmıştır. İnşaat devam etmektedir.

1.4. Muhtelif İşler

								Bin TL
Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2017 Sonu Kümülatif Harcama
2010H031840	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-2 (2 adet)	2010-2018	105.000	6.900 (101)	13.360 (101)	9.280	95	99.429

*Parantez içindeki tutar hibe olarak karşılanacaktır

Atatürk ve Gençlik Anıtı Kaplama Tadilatları



Nilüfer Hatun Öğrenci Yurdu Tadilatı ve Çevre Düzenlemesi İşİ



Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Tadilatları



Karacabey MYO WC Tadilatları



Merkez Kütüphane Boya İşleri



Açıklama :

1) Proje Revizyonları :

Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 6.900.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 6.460.000.-TL eklenmesi neticesinde toplam ödenek 13.360.000.-TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca proje kapsamında taşıt alımları için 101.000.-TL mevcut olup hibe olarak karşılanacak tutardır. Bu projeye ait nakdi gerçekleşme oranı %95 olmuştur.

2) 2017 Yılında Tamamlanan İşler;

- BÜYÜK ONARIM

- Nilüfer Hatun Öğrenci Yurdu Tadilatı ve Çevre Düzenlemesi İşİ
- Çevre Mühendisliği Binası Tadilat İşleri
- Ziraat Fakültesi Tadilat İşleri
- Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bölümler Binası Boya Badana İşleri
- Atatürk ve Gençlik Anıtı Kaplama Tadilatları
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çeşitli Tadilatlar
- Karacabey MYO WC Tadilatları
- Mimarlık Fakültesi Çatı Katı Ofis ve Bilgisayar Sınıfı Tadilatı
- Uzaktan Eğitim uygulama ve Araştırma Merkezi Tadilatları
- Merkez Kütüphane Boya İşleri
- Temel Tıp Bilimleri Tuvalet Tadilatları İşİ
- Bağlı Birim ve Merkezlerde 62 adet Tadilat-Onarım İşİ Gerçekleştirilmiştir.

MAKİNE TEÇHİZAT, BİLGİSAYAR, YAZILIM VE DONANIM ALIMLARI

2017 yılında eğitim-öğretim birimleri ile Rektörlük idari birimlerin talepleri mevcut ödenekler dahilinde karşılanmıştır.

1.5. Yayın Alımı

Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2017 Sonu Kümülatif Harcama
2017H037040	Basılı Yayın Alımı Elektronik Yayın Alımı	2017-2017	4.836	2.000	4.836	4.085	84	4.085

Açıklama :

1) Proje Revizyonları :

Yayın Alımı Projesi kapsamında 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 2.836.000.-TL eklenmiştir. Bu projeye ait nakdi gerçekleşme oranı %84 olmuştur.

2) 2017 Yılında Tamamlanan İşler

Yabancı Basılı Kitap alımı ihalesi (İKN 2017/524800) sözleşme bitim tarihi 2018'dir.

2. EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Bin TL	
							Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2017 Sonu Kümülatif Harcama
1992H050270	Tribün (500 seyirci kapasitesi)	1992-2017	5.875	1.500	2.375	2.374	99	5.874

Atletizm Pisti Tribünü Yapımı İşi





Açıklama :

Proje kapsamında 1.500.000.- TL ödenek tahsis edilmiş olup 2017 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından 1.875.000.-TL ödenek eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı 2.375.000.-TL olarak gerçekleşmiştir. Nakdi gerçekleşme oranı %99'dur.

1) 2017 Yılında Tamamlanan İşler;

- Atletizm Pisti Tribünü yapımı işi devam etmektedir. Atletizm Pisti Tribün inşaatı Proje revizyonu gerektiğinden 2018 yılında tamamlanacaktır.

3. SAĞLIK SEKTÖRÜ

3.1. Muhtelif İşler

Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2017 Sonu Kümülatif Harcama
2017I000620	Büyük Onarım, Makine Teçhizat,	2017	18.000 (2.000)	18.000 (2.000)	20.526 (2.580)	4.636 (2.580)	26	4.636 (2.580)

Bin TL

* Parantez içindeki miktar Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenektir

SUAM A-B Blok Muhtelif Birimlerin Kapı Pencere Doğramaları ve Banyo Tadilatları





Açıklama :

1) Proje Revizyonları

Bu projeye 18.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 2.000.000.-TL ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından 2.526.000.TL eklenmesi neticesinde toplam ödenek 22.526.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden tahsis edilen 2.580.000.-TL. tutarındaki ödeneğin tamamı proje kapsamında harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %26 olarak gerçekleşmiştir.

1) 2) 2017 Yılında Yapılan İşler :

SUAM A-B Blok muhtelif birimlerin kapı pencere doğramaları ve banyo tadilatları
Ayrıca muhtelif 26 adet tadilat yapılmıştır.

4. TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

4.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Bin TL								
Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2017 Sonu Kümülatif Harcama
2017K120570	Proje Desteği	2017-2017	8.680	8.332	8.680	8.680	100	8.680

Açıklama :

- Bu projeye 8.332.000.-TL.ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından 348.000.-TL ödenek eklenmesi neticesinde yıl sonu toplam ödenek 8.680.000.-TL. olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin tamamı harcama belgesine bağlanarak özel hesaba aktarılmıştır.
- 2017 yılında proje kapsamında 378 adet projeye destek sağlanmış olup bu projelerden 194 adedi tamamlanmıştır.

4.2. Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Bin TL								
Proje No	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Program Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Cari Yıl Harcama	Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	2017 Sonu Kümülatif Harcama
2011K120400	İnşaat (3.000 m ²) Makine- Teçhizat- Teknolojik Araştırma	2011-2017	12.554	10	10	0	0	12.544

Açıklama :

Merkezi Araştırma Laboratuvarı (2900 m²) inşaatı tamamlanmıştır. 4.036.000,00 –TL

5. TAMAMLANAN PROJELER

5.1.

Proje Kimlik Bilgileri		
1. Proje No :		
2. Proje Adı :		
3. Sektör/Altsektörü :		
Proje Parametreleri		
	Program	Gerçekleşme
4. Başlama-Bitiş Tarihi		
5. Karakteristiği		
6. Proje Tutarı (Maliyeti)		
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler		
7. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü		
8. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar		

IV. ÖNERİLER

Planlanan yatırımların istenen evsafa ve zamanında gerçekleştirilmesinde yaşanan problemlerin giderilmesi için gerek bütçe kullanımı gerekse ihale ihale mevzuatında gerekli düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir.

2017 YILI HARCAMALARI
DÖNEM GERÇEKLEŐME RAPORU
IV. DÖNEM

2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

DÖNEMİ = 2017 4. DÖNEM SONU

2017 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi
(Bin TL)

Sektör Adı : Eğitim

Bim No (1)	YSK (2)	PROJE NO (3)	PROJE ADI (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Sonu Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi(11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
302612	477	1978H030070	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2019	Bursa		150 000	139 126			3 000					2 125
302624	477	1991H031400	Derslikler ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2019	Bursa		140 000	107193			16 223					2 856
302636	477	1992H050270	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2017	Bursa		5 875	3 500			1 500	(+)	875			2 374
302571	477	2010H031840	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Bursa		105 000	90 149			6 900	(+)	6 460			9 280
302591	477	2010H031840	Muhtelif İşler	Taahhüt Hıbsesi	2018	Bursa						101					
302548	477	2013H031800	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2018	Bursa		4 973	2 027			1 696	(+)	1 250			717
302629	477	2017H037040	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2017	Bursa		4 836				4 836					4 085
TOPLAM I									410 684	341 995		34 256		8 585			21 437

2017 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi
(Bin TL)

Sektör Adı : Sağlık

Bim No (1)	YSK (2)	PROJE NO (3)	PROJE ADI (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Sonu Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi(11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
310198	477	2017I000590	Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2019	Bursa		250 000				19 500					
310218	477		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2018	Bursa		195 000				19 500					
310221	477		Makine-Teçhizat	ÖZEL BÜTÇE	2019	Bursa		55 000									
318107	477	2017I000620	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2017	Bursa		20 526				20 526					4 636
318110	477	2017I000620	Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2017	Bursa		2 580				2 580					2 580
TOPLAM II									273 106			42 606					7 216

2017 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi
(Bin TL)

Sektör Adı : DKH

Bim No (1)	YSK (2)	PROJE NO (3)	PROJE ADI (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Sonu Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi(11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
301156	477	2011K120400	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2017	Bursa		12 554	12 544			10						
301150	477		İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2015	Bursa		6 548	6 548									
301153	477		Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2017	Bursa		6 006	5 996			10						
301510	477	2017K120570	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2017	Bursa		8 680				8 680					8 680	
TOPLAM III									21.234	12.544	0	0	8.690	0	0	0	0	8.680
TOPLAM I + II + III									705 024	354 539			85 552		8 585			37 333

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü : GENEL İCMAL

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6	0	410.684	0	0	341.995	0	0	29.601	0	0	42.841	0	0	21.437
Sağlık	2	0	273.106	0	0	0	0	0	39.500	0	0	42.606	0	0	7.216
D.Kamu Hizm.															
- İktisadi															
- Sosyal	2	0	21.234	0	0	12.544	0	0	8.342	0	0	8.690	0	0	8.680
TOPLAM	10	0	705.024	0	0	354.539	0	0	77.443	0	0	94.137	0	0	37.333

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		410.684			341.995			29.500			42.740			21.437
Sağlık	2		270.526						37.500			40.026			4.636
D.Kamu Hizm.															
- İktisadi															
- Sosyal	2		21.234			12.544			8.342			8.690			8.680
TOPLAM	10	0	702.444	0	0	354.539	0	0	75.342	0	0	91.456	0	0	34.753

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü : DÖNER SERMAYE

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık	1		2.580					2.000			2.580				2.580
D.Kamu Hizm.															
- İktisadi															
- Sosyal															
TOPLAM	1	0	2.580	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.580	0	0	2.580

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü : HİBE

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme			
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		
Tarım																
Madencilik																
İmalat																
Enerji																
Ulaştırma-Hab.																
Turizm																
Konut																
Eğitim	1							101			101					
Sağlık																
D.Kamu Hizm.																
- İktisadi																
- Sosyal																
TOPLAM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	101	0	0	0
